

نهاية العلا



PROGRESS REPORT



مايو
2026

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

سلطنة عمان - مسقط - مرتفعات غلا



الأعمال المنجزة

Work Performed



تم الانتهاء من أعمال الهيكل السفلي (Substructure Works) بنسبة 100%.	1
تم الانتهاء من صب الخرسانة لأعمال طبقة التسوية وسقف الطابق الأرضي بنسبة 100%.	2
أعمال الشدات الخشبية وحديد التسليح لسقف الطابق الأول جارية بنسبة 50%.	3
	4
	5
	6
	7
	8

4400 م²
مساحة البناء




نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%12



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

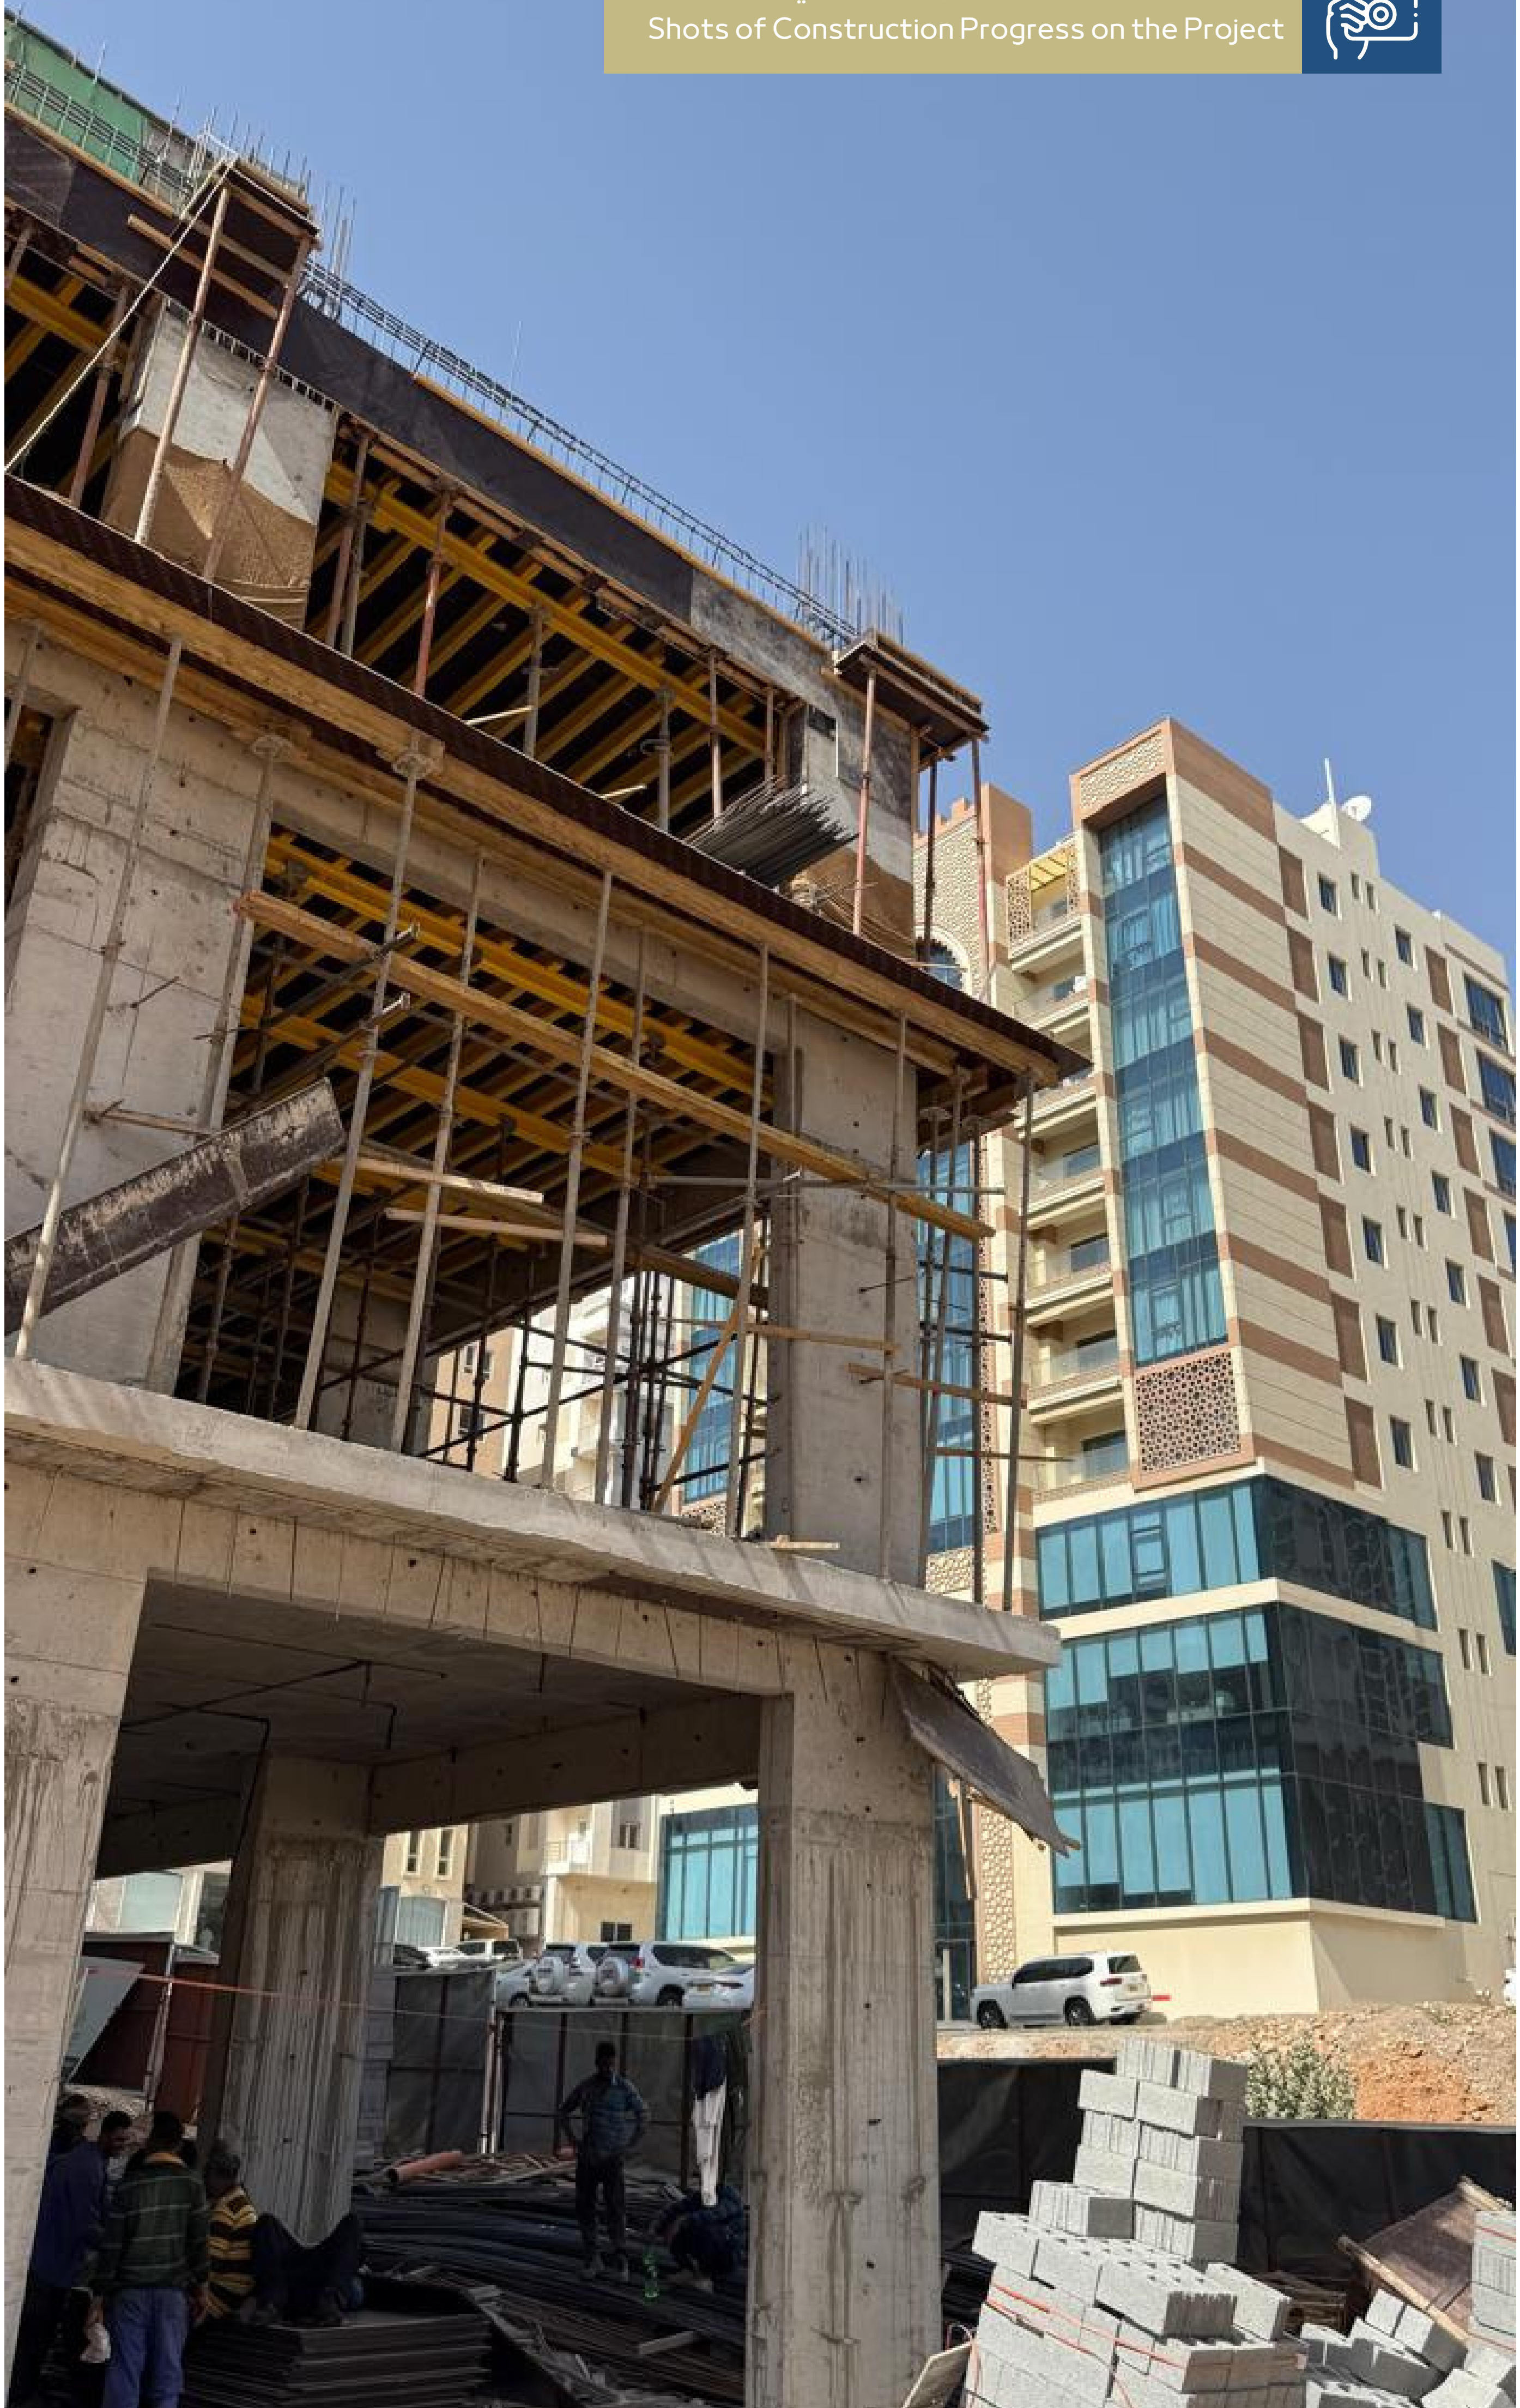

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





5 دقائق الى
مطار مسقط الدولي



10 دقائق الى
مول عمان



4 دقائق الى
شارع مسقط السريع



5 دقائق الى
مدينة العرفان


ولاية بوشر - مرتفعات غلا

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



مقاول
المشروع

ساس
الفخامة



المطور
العقاري

يناير
2028



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om
