



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



PROGRESS REPORT

أغسطس
2025

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

سلطنة عمان - بوشر - منطقة الامين

الأعمال المنجزة Work Performed



أعمال حفر الأساسات مكتملة بنسبة ١٠٠٪.

1

أعمال ردم التربة أسفل الطوافة مكتملة بنسبة ١٠٠٪.

2

أعمال الخرسانة المسلحة أسفل الطوافة مكتملة بنسبة ١٠٠٪.

3

أعمال تسليح الطوافة قيد التنفيذ بنسبة ٢٥٪.

4

5

6

3963.5 م² مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%7




لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

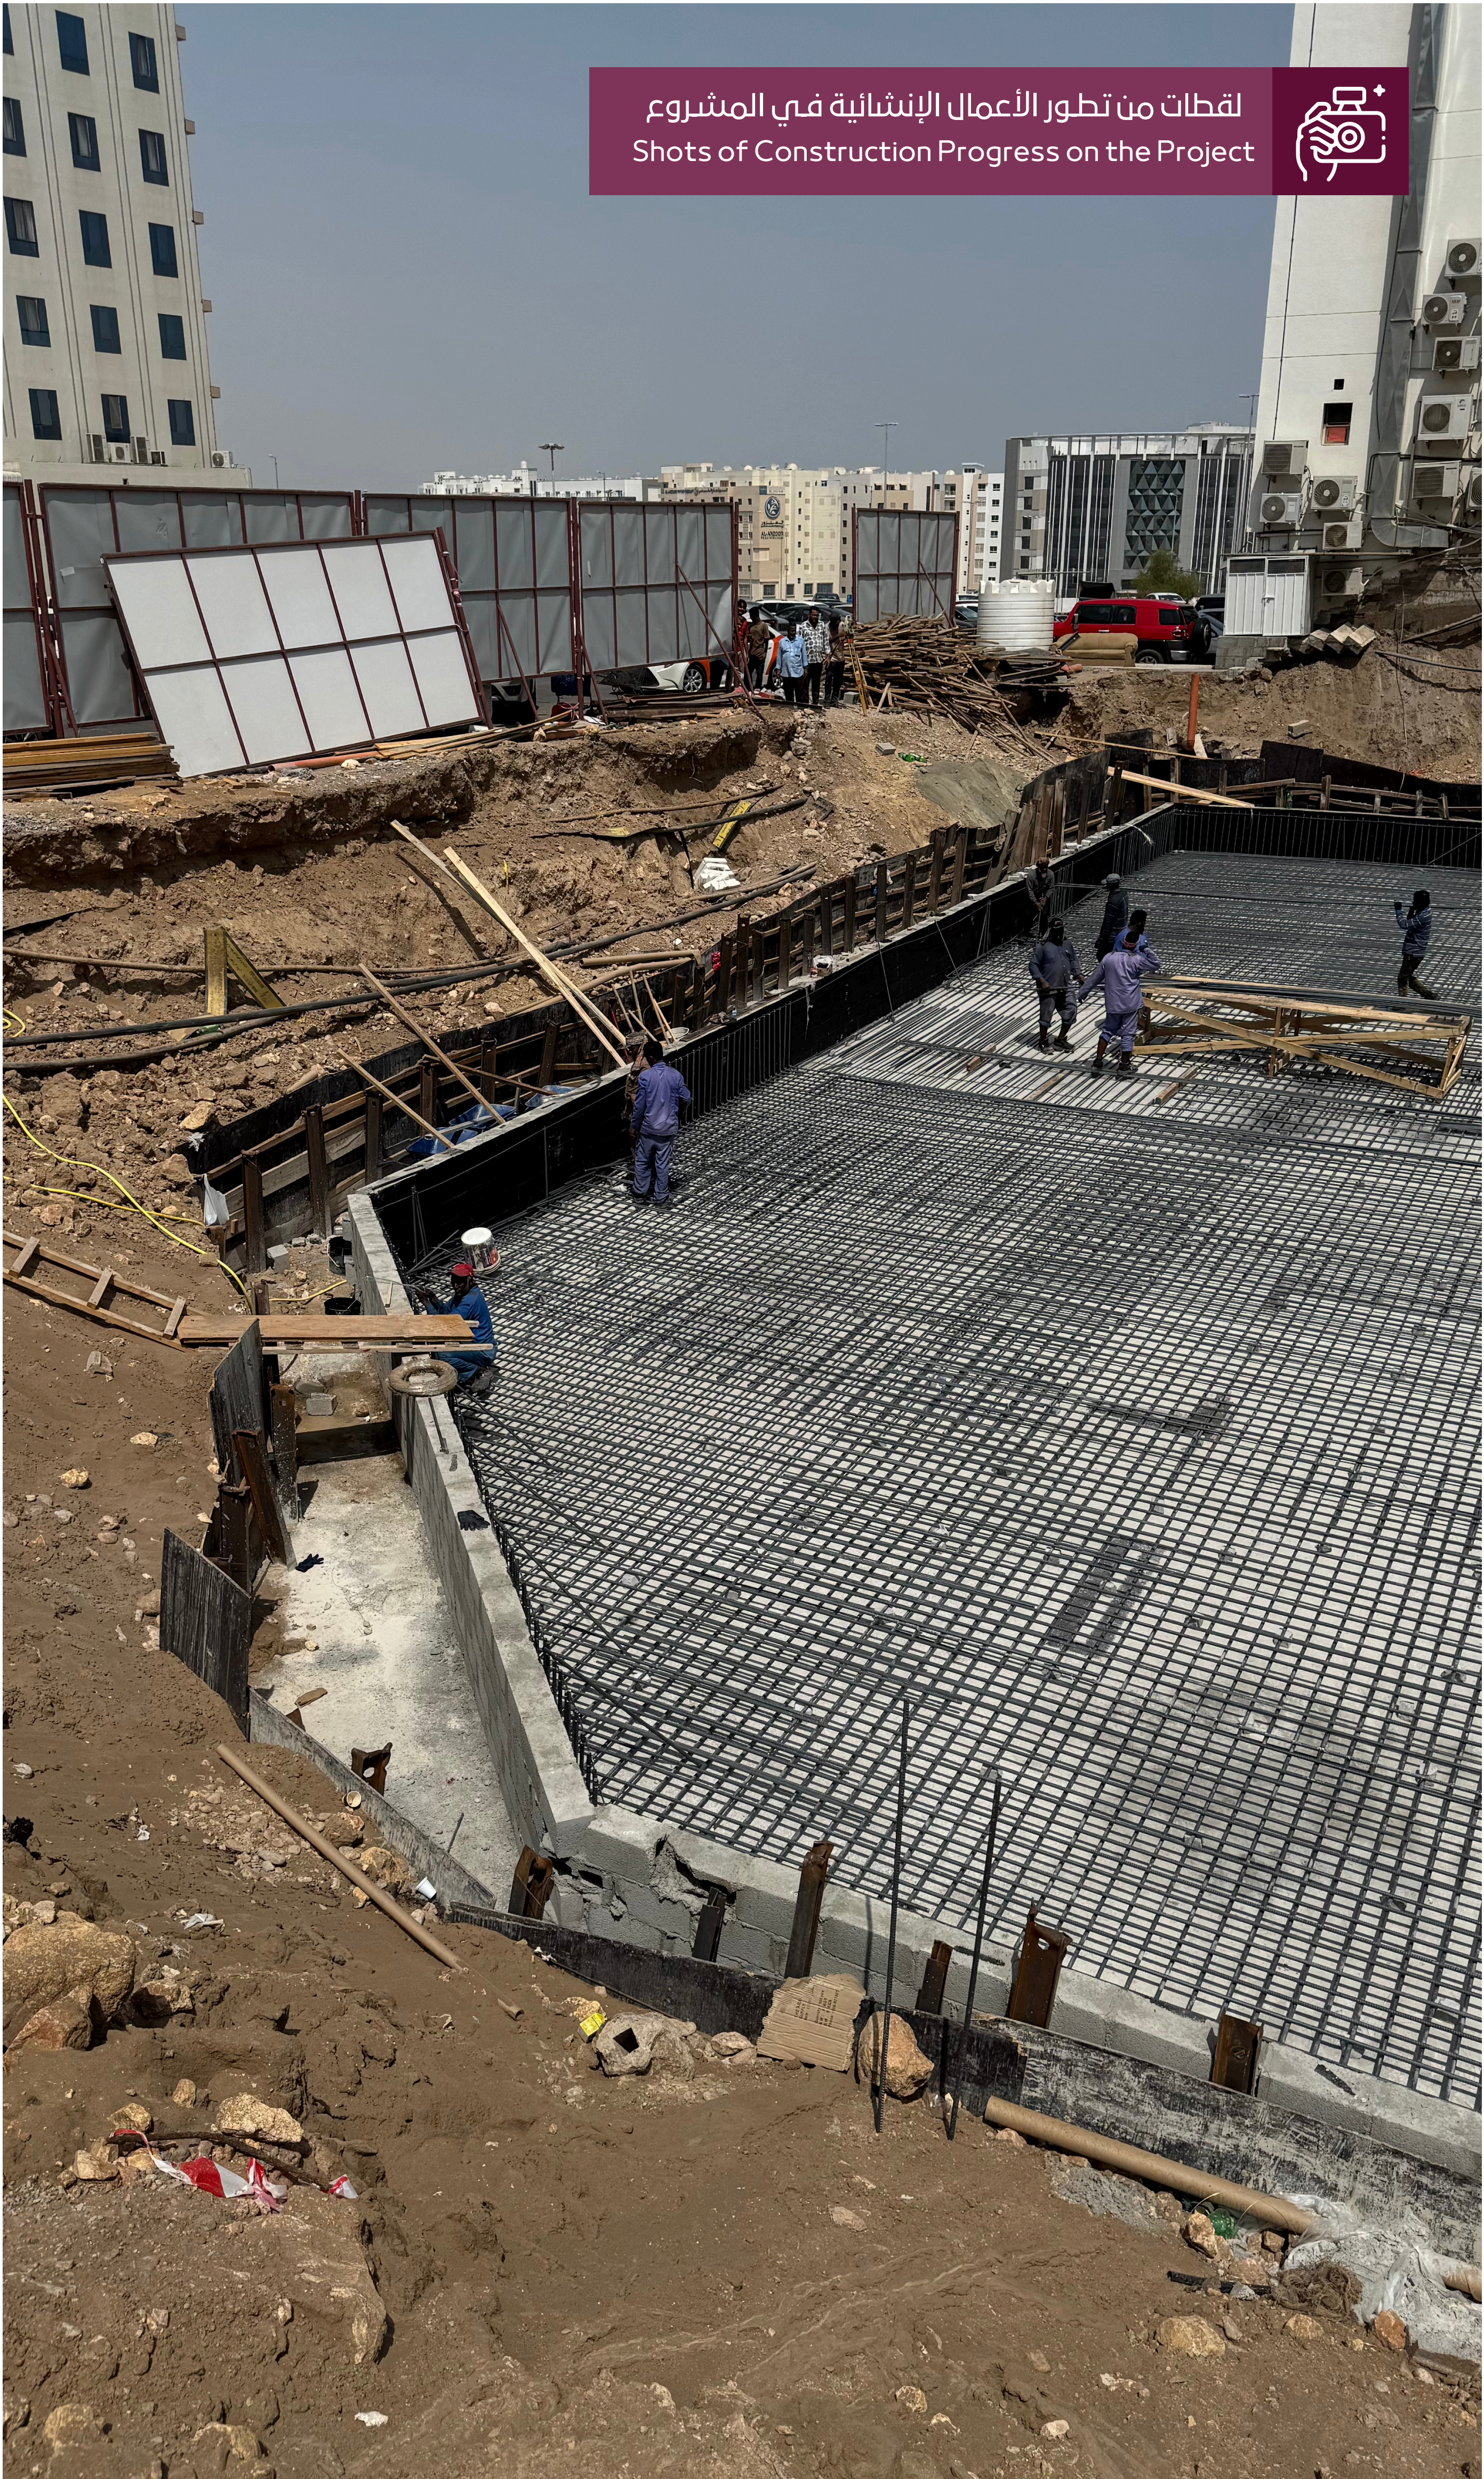



10 دقائق الى
مطار مسقط الدولي



3دقائق الى
مول عمان



4 دقائق الى
شارع مسقط السريم



5 دقائق الى
بانوراما مول

بوشر - منطقة محمد الامين

sasluxury_om

الأرض الكبرى للتعمير
والإنشاءات



مقاول
المشروع

ساس
الفخامة



المطور
العقاري

ديسمبر
2027



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om
