



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

مُفْتَتحة

**PROGRESS
REPORT**

**مايو
2026**

**تقرير
الإنجاز
الشهري**

موقع المشروع :

مسقط - ولاية السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة Work Performed



1

تم الانتهاء من صب أعمدة الطابق الأرضي بنسبة 100%.

2

تم الانتهاء من أعمال الشدات لسقف الطابق الأرضي بنسبة 100%.

3

تم الانتهاء من أعمال حديد التسليح وصب سقف الطابق الأرضي بنسبة 100%.

4

تم الانتهاء من أعمال حديد التسليح والشدات وصب أعمدة الطابق الأول بنسبة 100%.

5

أعمال الشدات لسقف الطابق الأول جارية حالياً.

6

2442 م²
مساحة البناء




نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%15




لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

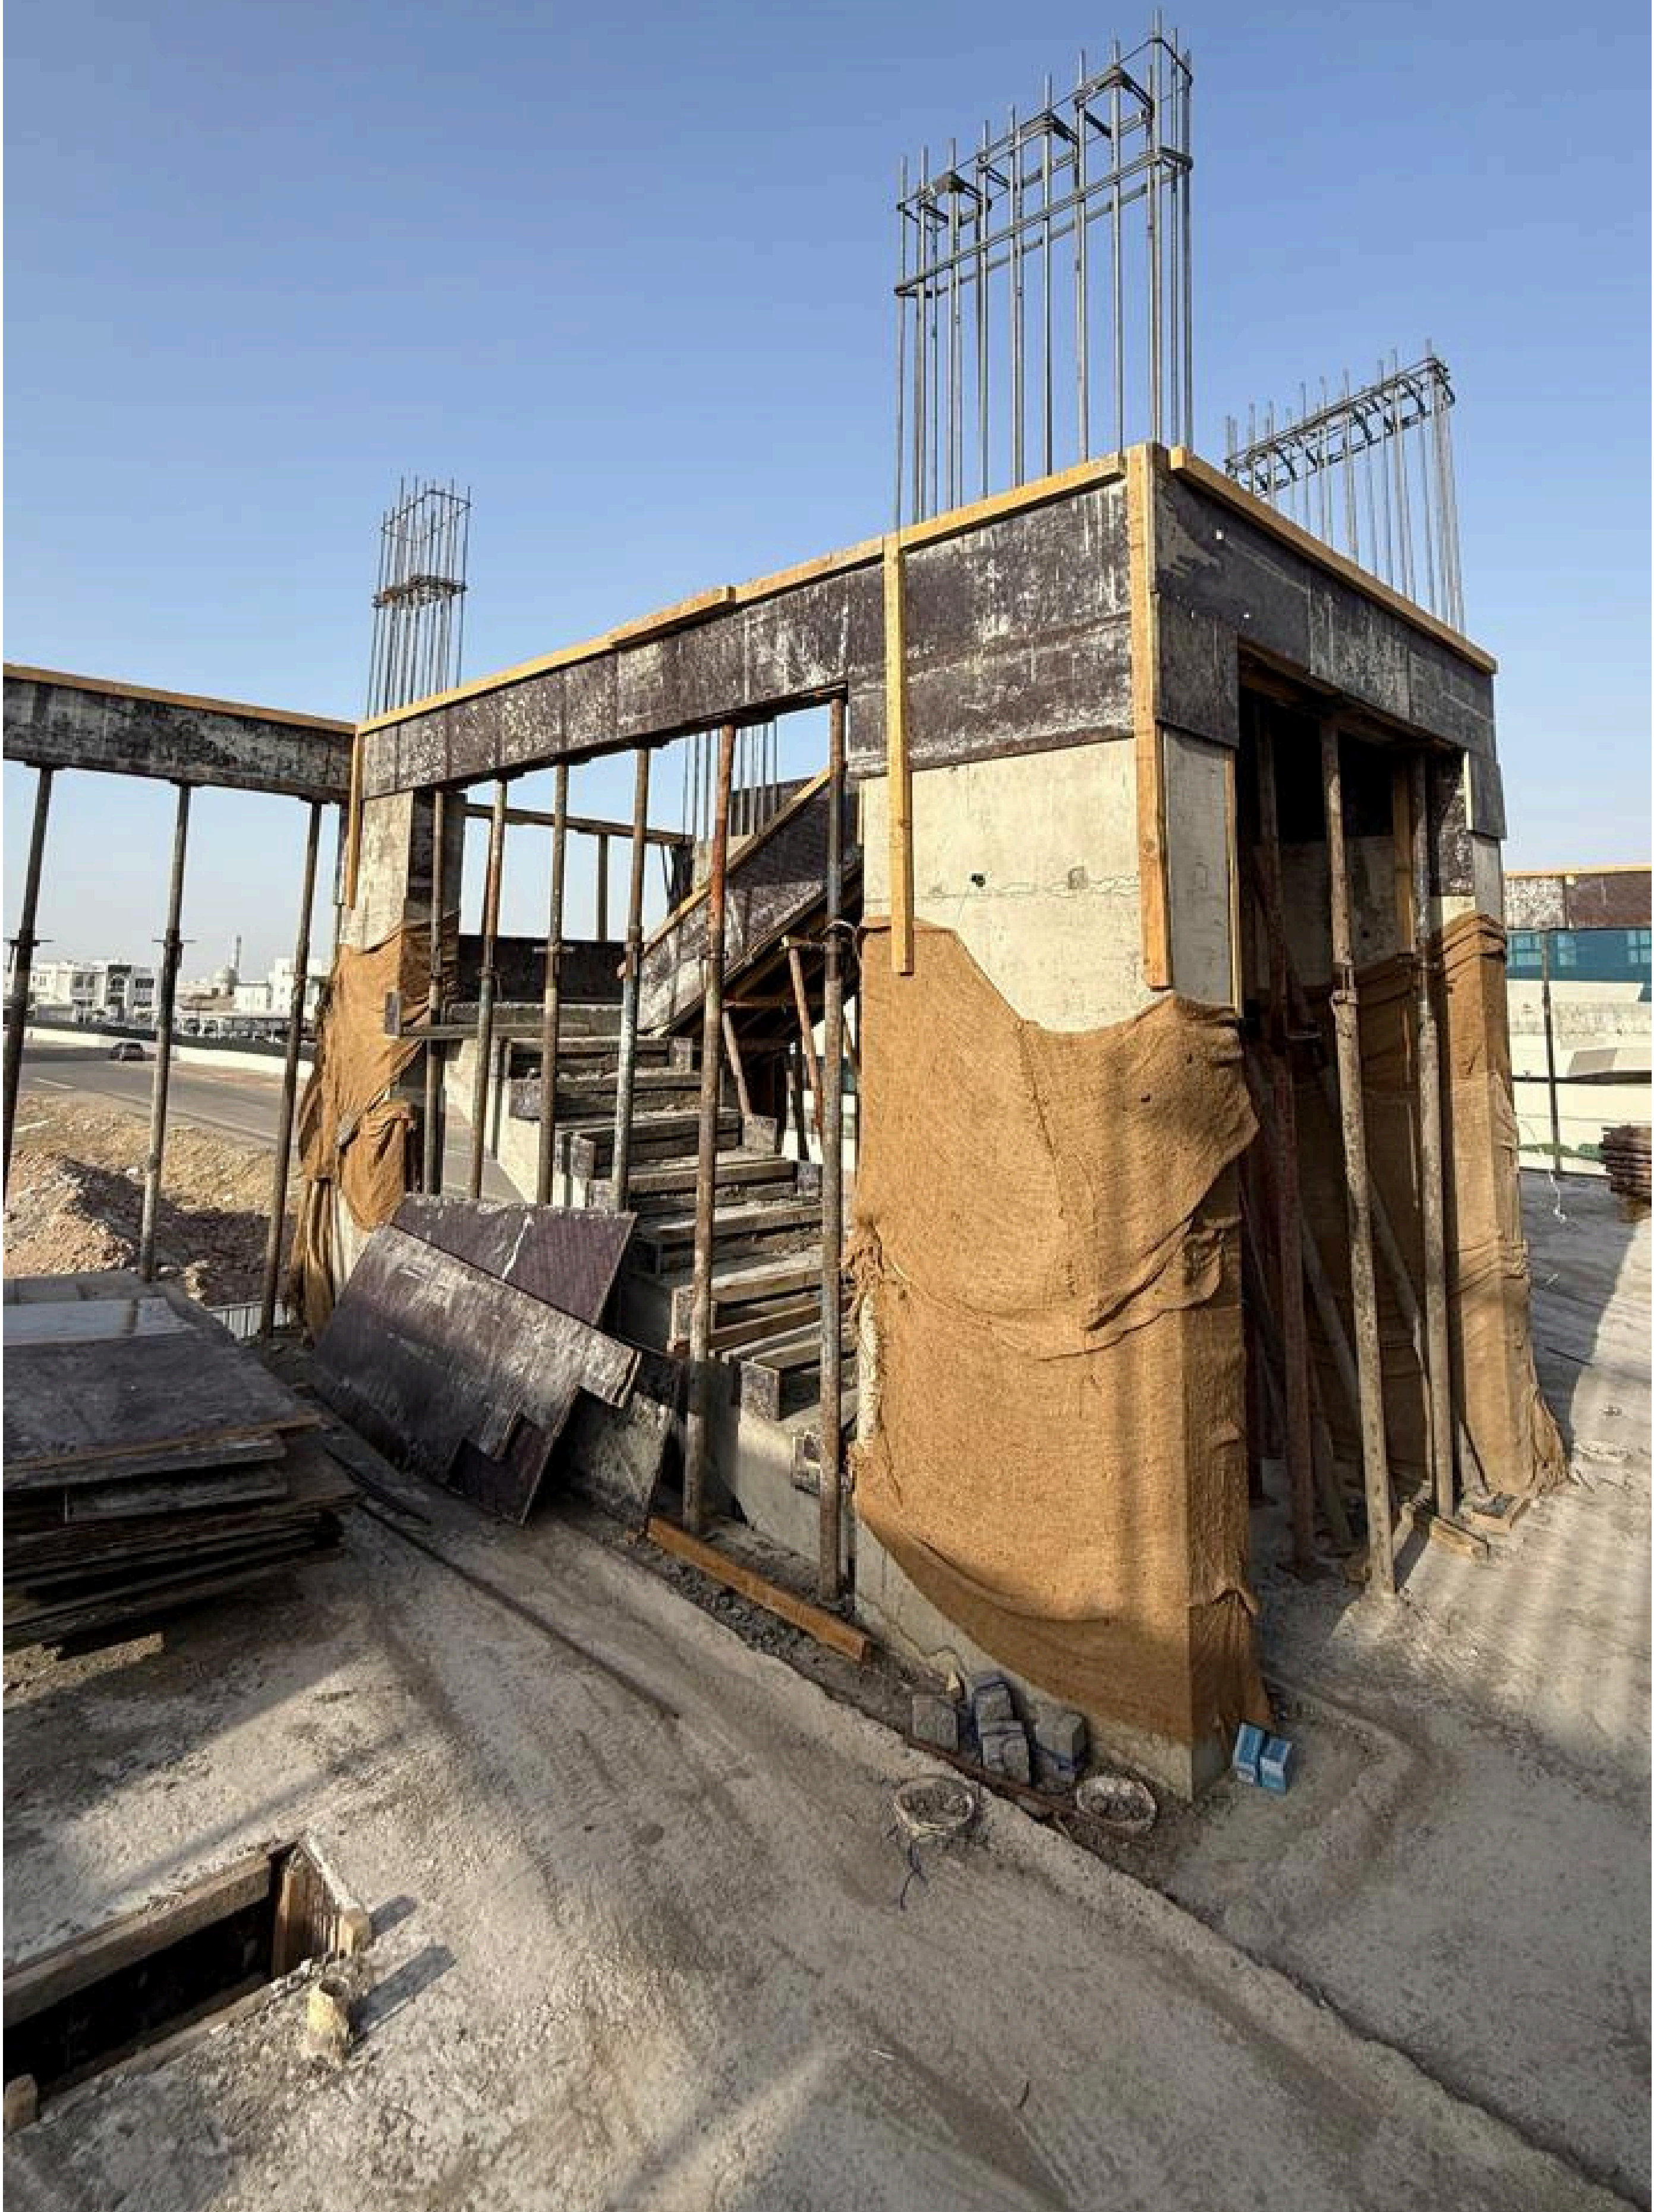

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

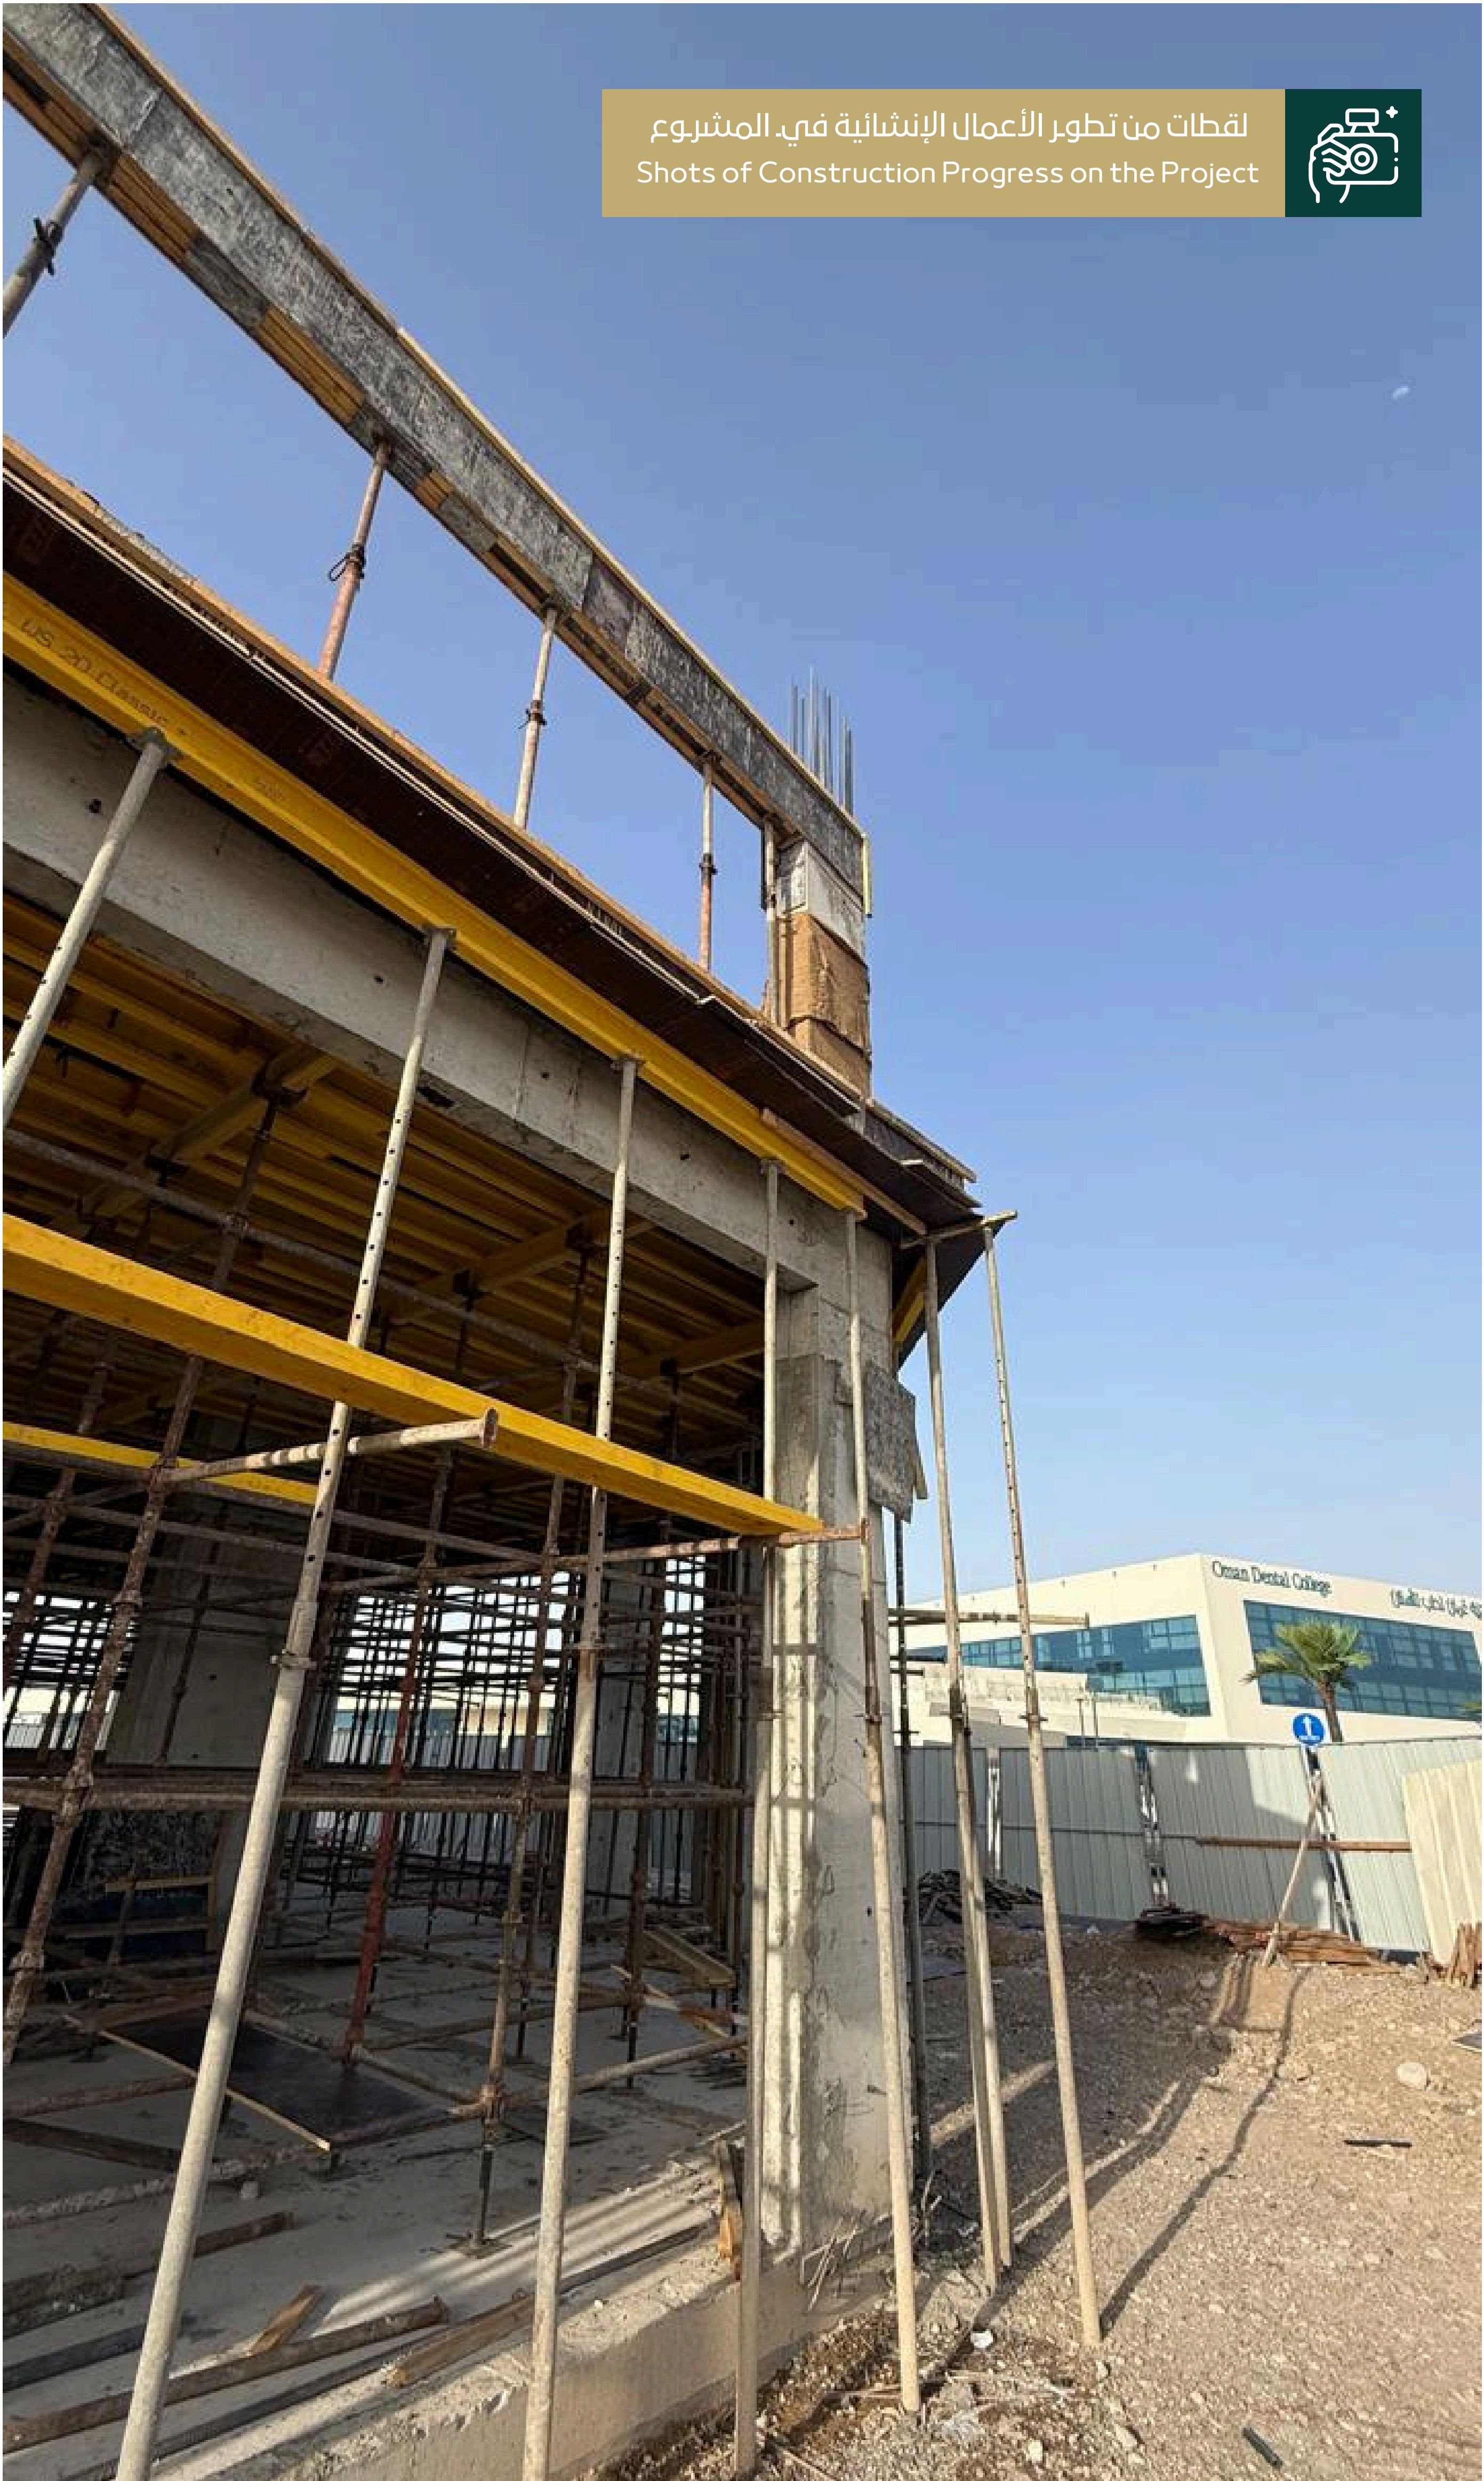

شارفة

SHARFA

2442 م²
مساحة البناء



دقائق الى 5
حناية المعبيلة

ODC

دقائق الى 1
كلية عمان لطب الاسنان



دقائق الى 2
شارع مسقط السريم.



دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

ولاية السيب - المعبيلة

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



مقاول
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



المطور
العقاري

ساس
الفخامة



تسليم
المشروع

يناير
2028

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om
