SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

ALJOUD
الجود



PROGRESS REPORT

تقريرُ الإنجاز الشهري

سبتمبر 2026

موقع المشروع :

سلطنة عمان -ولاية بوشر - الانصب

الأعـمـالُ المـنـجـزة
Work Performed

1. تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية (PCC).
2. تم الانتهاء من تنفيذ نظام العزل المائي للخرسانة العادية (PCC).
3. تم الانتهاء من صب الخرسانة للأساسات الحصيرية (Raft Foundation).
4. تم الانتهاء من صب الخرسانة للأعمدة القصيرة (Stub Columns).
5. تم الانتهاء من صب الخرسانة للميدات الأرضية (Plinth Beams).
6.




نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%10

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

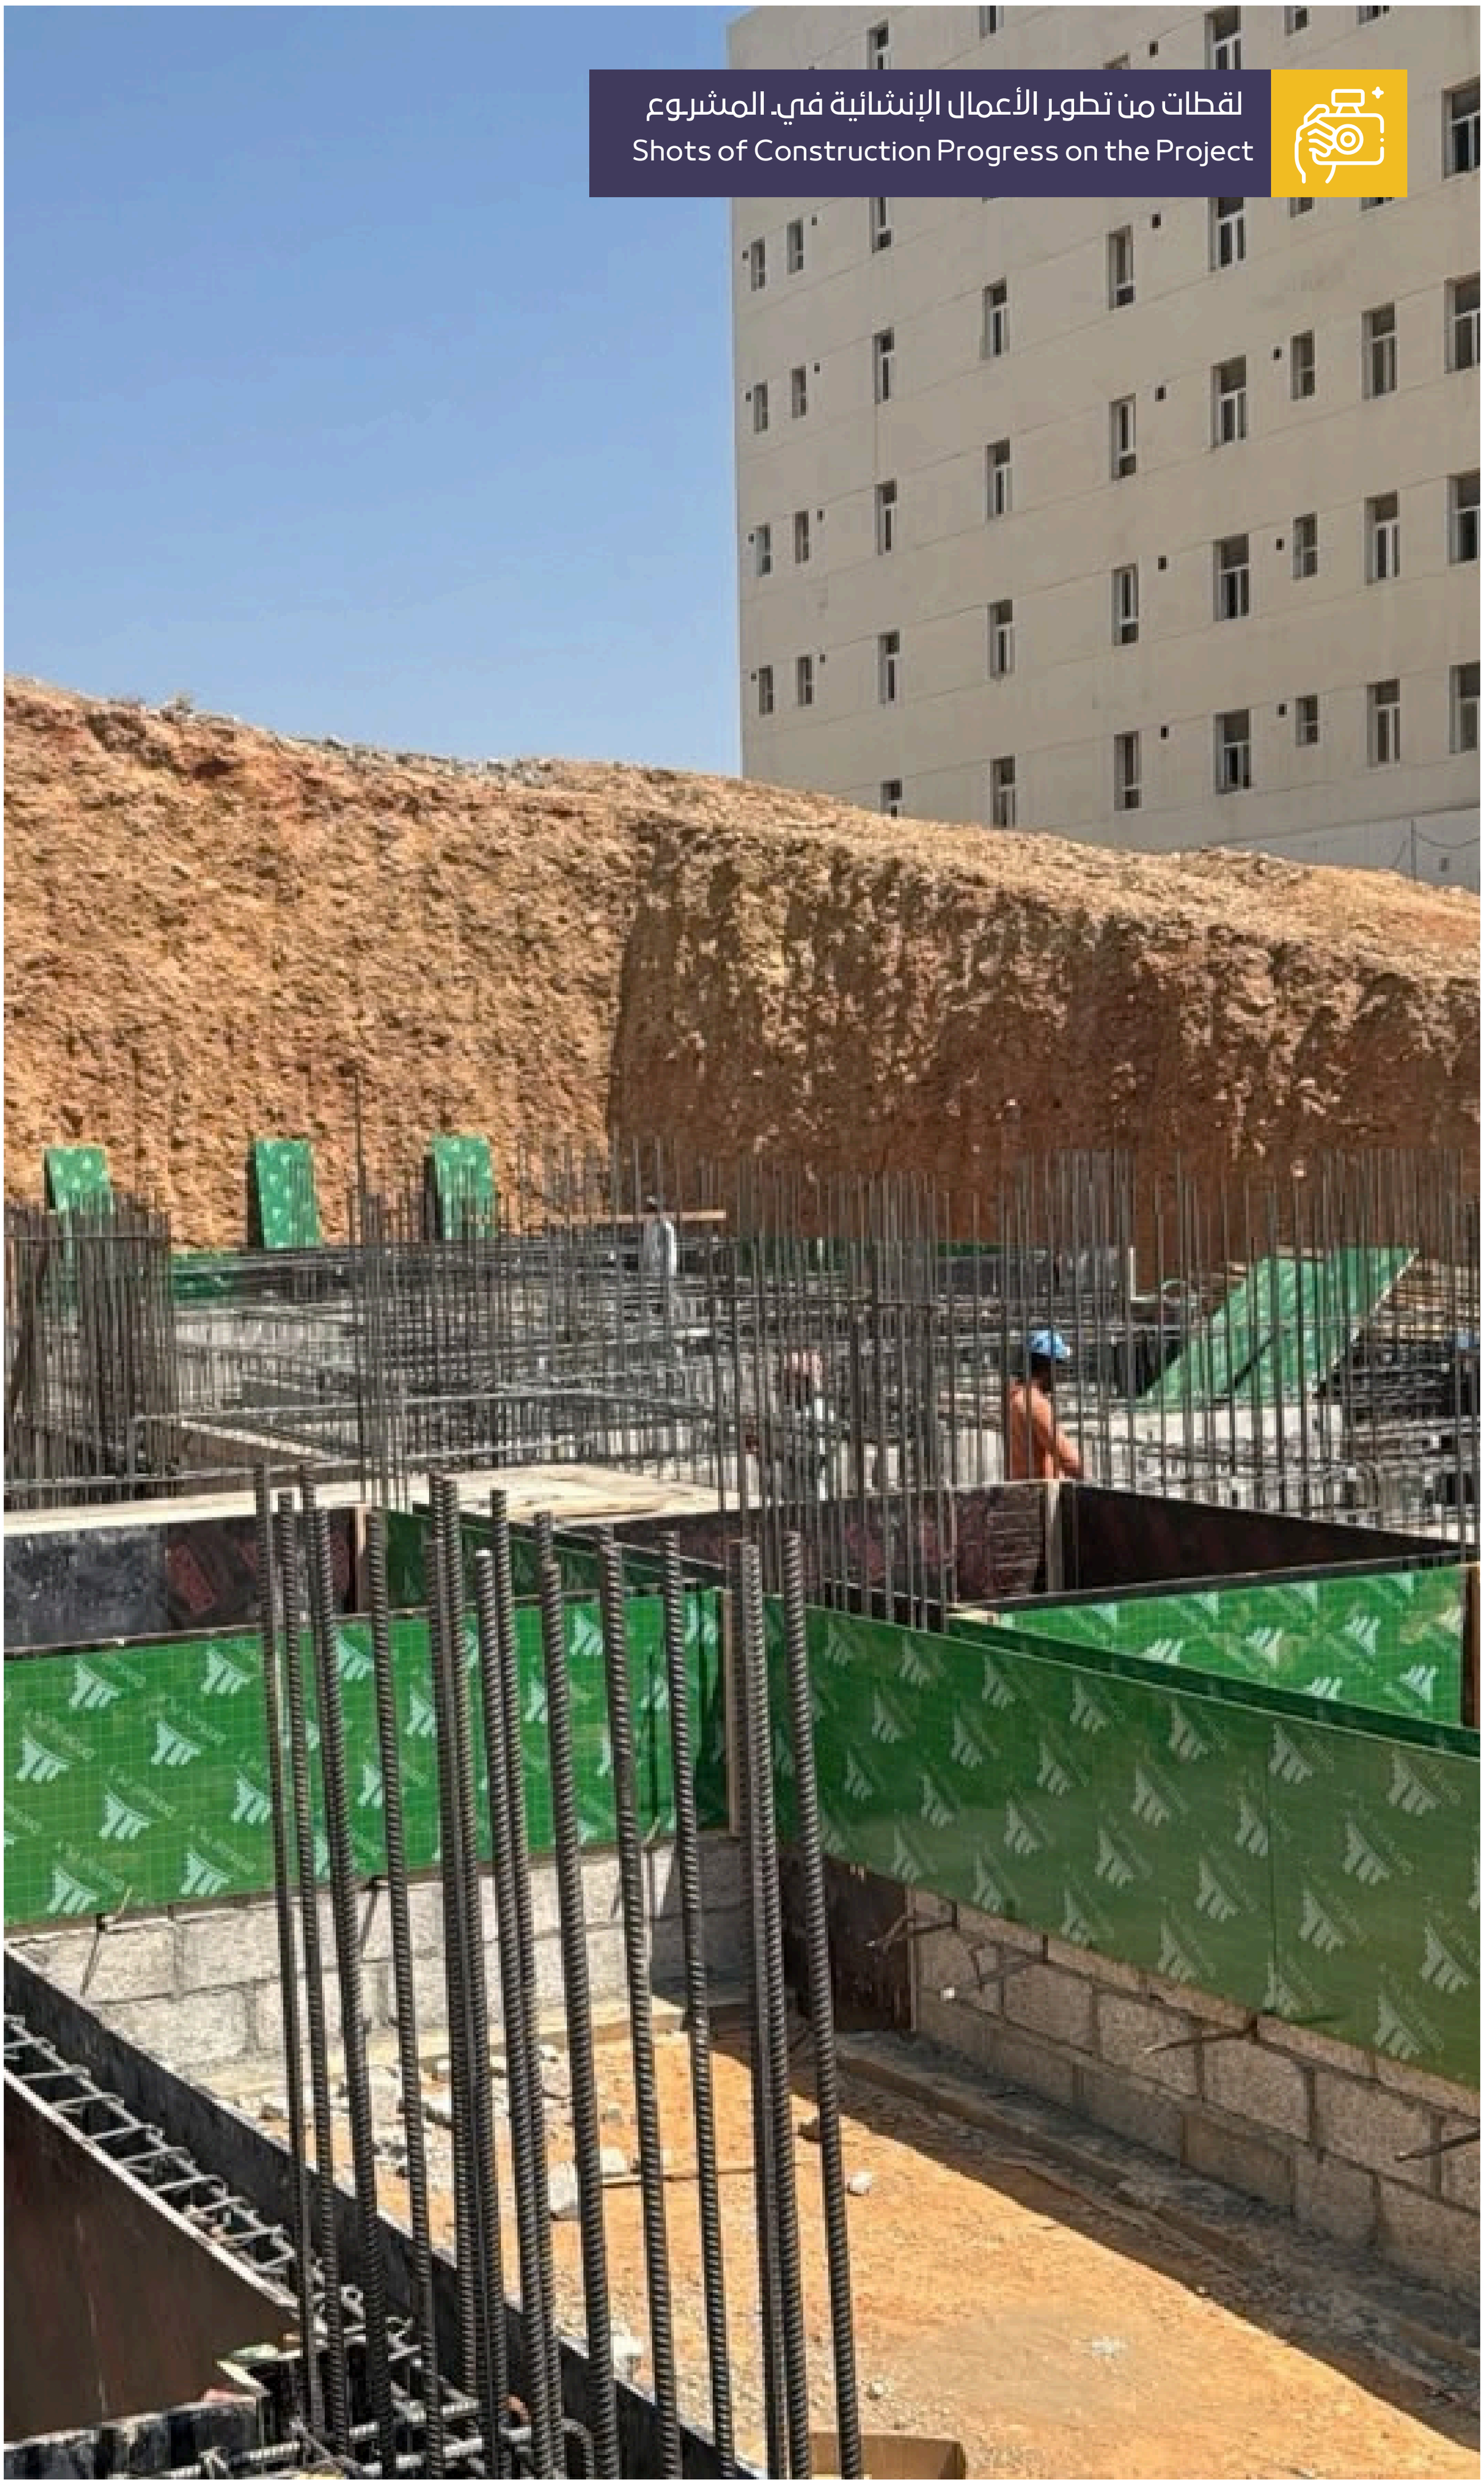

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 5
لولو الانصب

دقائق الى 8
شارع مسقط الســريـع.

دقائق الى10
مول عمــان

دقائق الى 15
مطار مـــسقـط الدولي

سلطنة عمان - ولاية الانصب

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

ALJOUD
الجود

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يوليو
2028

شـــكراً لثقتـــكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om
