SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بناية العلا 2

تقريرُ الإنجاز الشهري

PROGRESS REPORT

سبتمبر 2026

موقع المشروع :
سلطنة عمان - مسقط - مرتفعات غلا

الأعمالُ المنجزة
Work Performed

1	• تم الانتهاء من أعمال الهيكل السفلي (Substructure).
2	تم الانتهاء من صب الخرسانة لأعمال التسوية (Leveling) وسقف الطابق الأرضي.
3	تم الانتهاء من صب الخرسانة لسقف الطابق الثامن.
4	جارٍ تنفيذ أعمال الشدات الخشبية (Shuttering) لسقف الطابق التاسع.
5	جارٍ تنفيذ أعمال البناء بالطابوق لسقف الطابق الأرضي، بنسبة إنجاز 80%.
6	جارٍ تنفيذ أعمال البناء بالطابوق في الطابقين الرابع والثاني، بنسبة إنجاز 80%.
7	جارٍ تنفيذ أعمال تمديد وتركيب أكمام ومواسير الخدمات الكهروميكانيكية (MEP)، بنسبة إنجاز 30%.
8	
9	



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1 %42

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

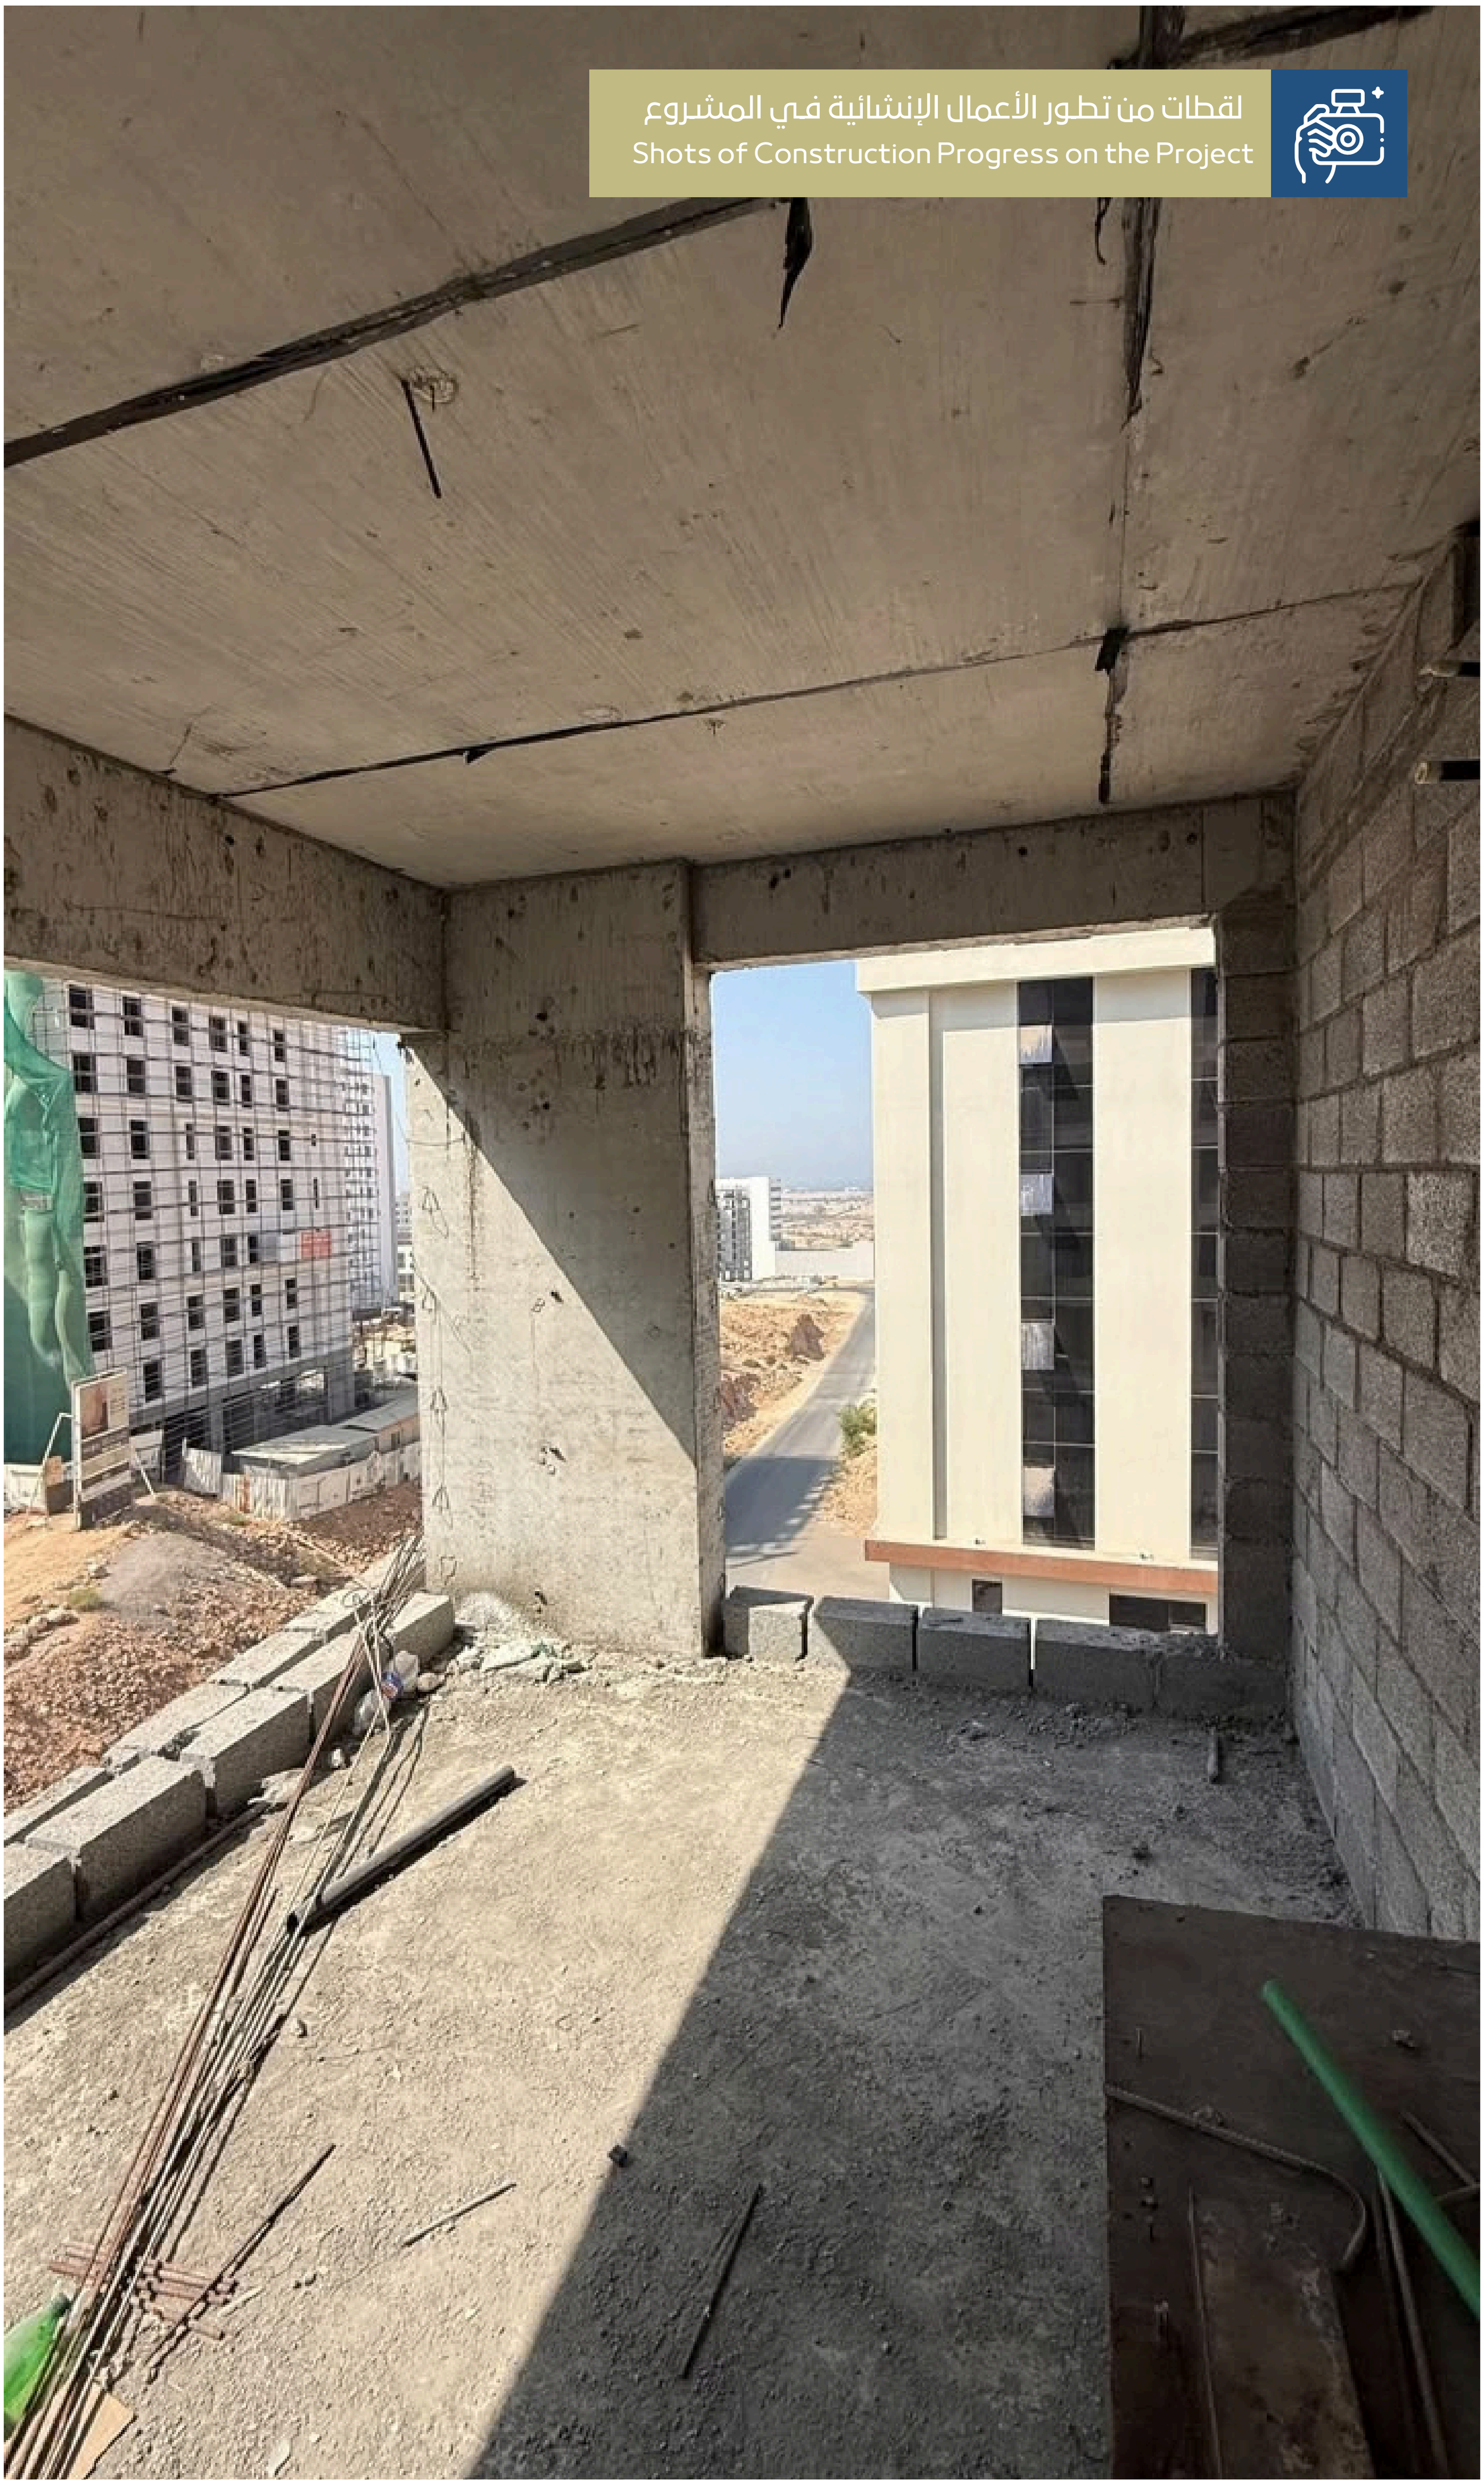

بناية العُلا 2

بناية العُلا 1

5 دقائق الى **مدينــة العرفــان**	4 دقائق الى **شارع مسقط الســريــع**	10دقائق الى **مول عمـــان**	5 دقائق الى **مـطار مـــسقـط الدولي**

ولاية بوشر -مرتفعـــات غـــلا

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يناير
2028

شـــكراً لثقتـــكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om
