SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

تقرير الإنجاز الشهري

PROGRESS REPORT

يوليو
2026


موقع المشروع :
مسقط- ولاية السيب - المعبيلة

الأعمالُ المنجزة
Work Performed

1. تم الانتهاء من أعمال بناء البلوك للطابق الأرضي (GF).
2. أعمال بناء البلوك للطابق الأول مستمرة بنسبة إنجاز 45%.
3. تم الانتهاء من أعمال تركيب الشدة الخشبية (Shuttering) لسقف الطابق الثالث.
4.
5.
6.

2471 م²

مساحة البناء

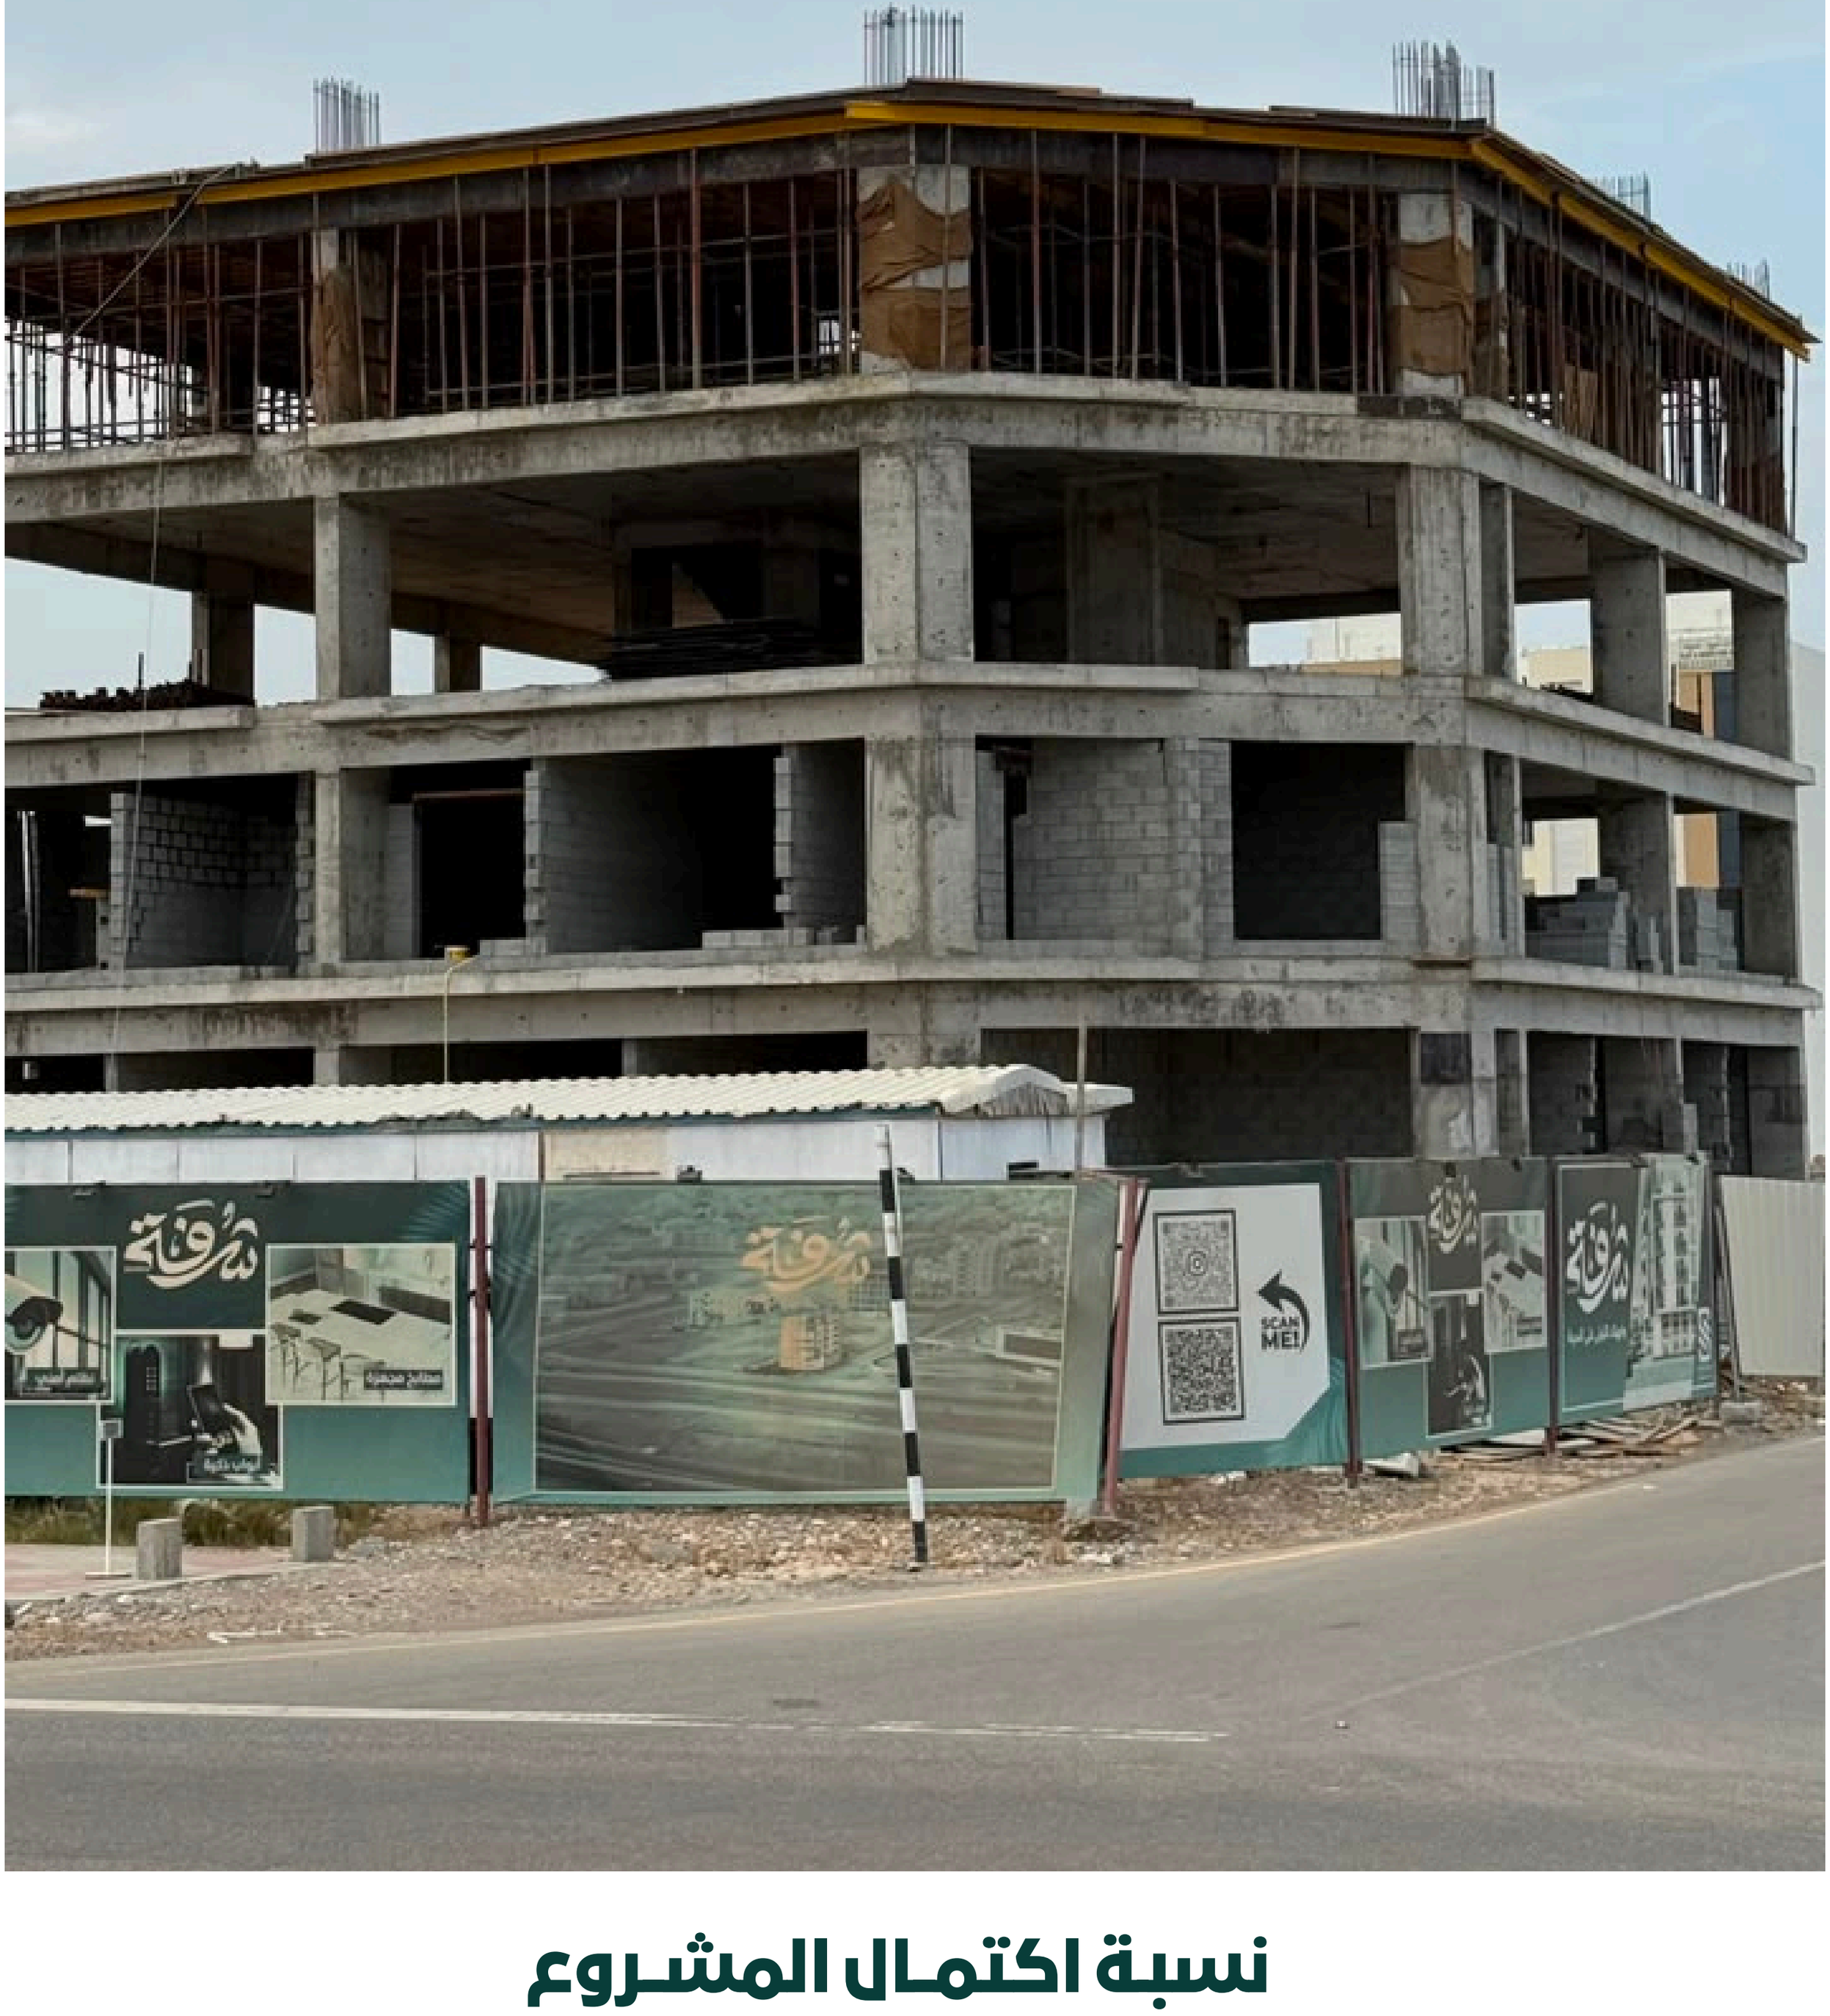

نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1 %25

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

شرفة

SHARFA



2442 م²

مساحة البناء

دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

دقائق الى 2
شارع مسقط السـريـع.

دقائق الى 1
كلية عمان لطب الاسنان

دقائق الى 5
صناية المعبيلة

ولاية السيب - المعبيلة

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

مقاول
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يناير
2028

شـكـراً لثقتـكـم

Thanks for your Trust

sasluxury_om
